



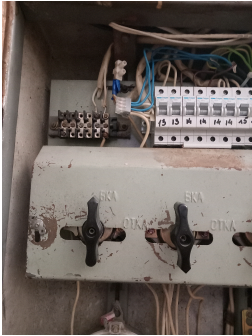
NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA545233





Data: 2023-05-18Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: A. P. Kavoliuko g. 32(458), Vilnius
SostinėProblema: 1. AS skydų remontas 1 ir 2 laiptinių.
2. JAS-2 liftų įvadinio skydasDefektas (aprašas): Dabartinė apskaitos skydų būklė negarantuoja saugaus ir patikimo elektros energijos tiekimo į butus. Butų el. energijos apskaitos skyduose nėra galios ribojimo prieš el. energijos skaitiklius (EL. LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS 507p.) Prijungimo gnybtai prie magistralinių laidų yra paveikti korozijos, neužtikrina patikimo kontaktinio sujungimo. Dėl nuolat perkrauto lokalaus tinklo kontaktai kaista, gali kilti gaisro pavojus, o nudegus nuliniam (N) kontaktui gali sugesti būtinė technika. Magistralinių linijų gnybtai yra atviri, yra galimybė prisiliesti prie elektrai laidžių daliųDefekto vieta: AS skydai ir JAS-2 liftų skydasSprendimas: 1. Pakeisti magistralinių linijų prijungimo gnybtus į uždaro tipo LZG gnybtus. 2. Montavimo aliumininis laidus keisti į varinius. 3. Sumontuoti naujus automatinis jungiklius ir OBL jungtis.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing)
