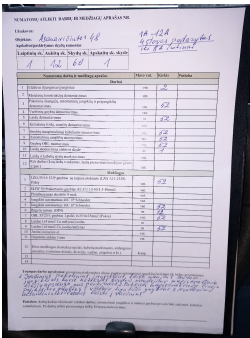



NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA578542Data: 2023-12-15Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Loretos Asanavičiūtės g. 48, Vilnius
SostinėProblema: AS skydu remontasDefektas (aprašas): Dabartinė apskaitos skydu būklė negarantuoja saugaus ir patikimo elektros energijos tiekimo į butus. Butų el. energijos apskaitos skyduose nėra galios ribojimo prieš el. energijos skaitiklius (EL. LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS 507p.) Prijungimo gnybtai prie magistralinių laidų yra paveikti korozijos, neužtikrina patikimo kontaktinio sujungimo. Dėl nuolat perkrauto lokalaus tinklo kontaktai kaista, gali kilti gaisro pavojus, o nudegus nuliniams (N) kontaktui gali sugesti buitinė technika. Magistralinių linijų gnybtai yra atviri, yra galimybė prisiliesti prie elektrai laidžių daliųDefekto vieta: laiptinėSprendimas: 1. Įvadinius paketinius jungiklius keisti naujais automatiniais jungikliais, kurie užtikrins bendro naudojimo magistralinių linijų apsaugą nuo perkrovos. 2. Pakeisti magistralinių linijų prijungimo gnybtus į uždaro tipo LZG gnybtus. 3. Montavimo aliumininius laidus keisti į varinius.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		9550306d-e5e9-4eae-b3bf-165c3c34f1cd
2		4ce676b6-706a-4d44-8d4d-de2eab5eab4c

3		a085a0ac-fd49-4886-8935-1f28e88092d7
4		c89f24cb-ab46-4655-aba3-aa19f6e0f567
5		a0ed635c-1eb4-4ee3-bd1c-625b0c9dd826

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing)
