


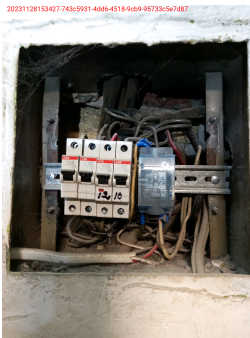
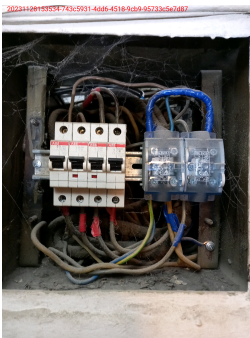
NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA587364

Data: 2024-02-13Klientas: UAB Mano Būstas
VilniusObjektas: J. Basanavičiaus g. 17A, VilniusProblema: Objekte 2 laiptinei pastebėti netvarkingi magistraliniai laidai bei apskaitos skydai. Gyvybes bei ir sveikatos pavojus.Defektas (aprašas): Dabartinė apskaitos skydų būklė negarantuoja saugaus ir patikimo elektros energijos tiekimo į butus. Prijungimo gnybtai prie magistralinių laidų yra paveikti korozijos, neužtikrina patikimo kontaktinio sujungimo. Dėl nuolat perkrauto lokalaus tinklo kontaktai kaista, gali kilti gaisro pavojus, o nudegus nuliniam (N) kontaktui gali sugesti buitinė technika. Magistralinių linijų gnybtai yra atviri, yra galimybė prisiliesti prie elektrai laidžių dalių. Laidų izoliacija yra mechaniškai pažeista, matosi atviri laidininkai, kurie gali sukelti trumpą jungimą prisilietus prie metalinių korpuso dalių.Defekto vieta: 2 laiptineSprendimas: 2 laiptinei atlikti pakeitima megistaliniu laidu bei apskaitos skydų. Darbų ir medžiagu aprašas padetas dokumentacijai.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darbų valdytojas Valerij Babičev

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		
2		
3		

4		
---	---	--

Spausdino: Valerij Babičev (Service)
