

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA413677

Data: 2024-01-12

Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Sausio 13-osios g. 13, Vilnius
Sostinė

Problema: ne tvarkingi as skydai

Defektas (aprašas): (1) Dabartinė apskaitos skydų būklė negarantuoja saugaus ir patikimo elektros energijos tiekimo į butus. Butų el. energijos apskaitos skyduose nėra galios ribojimo prieš el. energijos skaitiklius (EL. LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS 507p.) Prijungimo gnybtai prie magistr. laidų yra paveikti korozijos, neužtikrina patikimo kontaktinio sujungimo. Dėl nuolat perkrauto lokalaus tinklo kontaktai kaista, gali kilti gaisro pavojus, o nudegus nuliniam (N) kontaktui gali sugesti buitinė technika. Magistralinių linijų gnybtai yra atviri, yra galimybė prisiliesti prie elektrai laidžių dalių

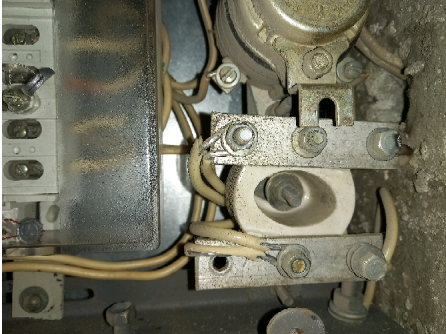
Defekto vieta: AS skydai

Sprendimas: 1.Įvadinius paketinius jungiklius keisti naujais automatiniais jungikliais, kurie užtikrins bendro naudojimo magistralinių linijų apsaugą nuo perkrovos. 2.Pakeisti magistralinių linijų prijungimo gnybtus į uždaro tipo LZG gnybtus. 3. Montavimo aliumininis laidas keisti į varinius.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		ed9455e6-8130-4ce7-a430-19c2f3f85162
2		d4e761ef-f551-48c8-97c7-627b0ee4eec4
3		866bda54-0ee4-434f-89c9-b0e405cb100f

4		29bf225e-0cbd-4632-82d3-4f50333b64c7
---	---	--------------------------------------

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing))
