

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2023.11.16

KAV : Mano Būstas Klaipėda


Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Pietinė g. 3 Klaipėda

Problema : 3-os laiptinės seni langai

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	<b>Atliekami darbai</b>		
1	Senų langų demontavimas	VNT.	5
2	Lauko palangių demontavimas	VNT.	4
3	Naujų langų sumontavimas technologiškai (1,46m x 0,85m)	VNT.	5
4	Naujų lauko palangių lankstinių įrengimas	VNT.	4
5	Angokraščių apdailos atstatymas	M2	4.5
6	Darbo vietos susitvarkymas	VNT.	4

**Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas. Langų matmenys preliminarūs, prieš užsakant langus būtina išsimatuoti tiksliai.**

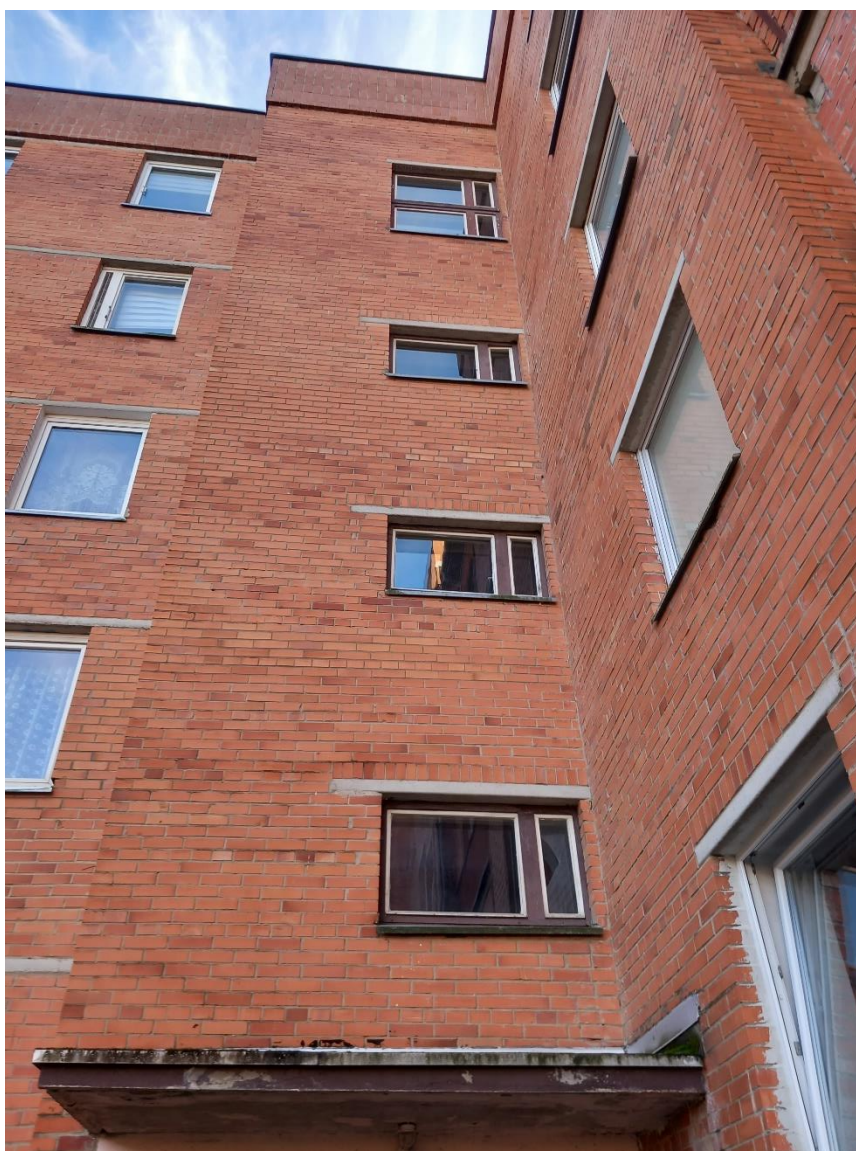



Priežiūros inžinierius  
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)
