

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1674276-3

Data: 2022-06-13

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas Neris"

Objektas: Nemenčinės pl. 4a, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA394252


Sprendimas: Atlikti fasado remonto darbus pagal TI sprendimą: "Pašalinus priežastis atstatyti suirusį plytų mūrą, keičiant plytas. Atstatyti plytų netektis tinkuojant ir dažant nerekomenduojama. Nes dėl dažymo paviršiai mažiau įgers vandens, todėl didesnis jo kiekis nutekės žemyn. Dėl valkšnumo tinkas trauksis, per atsiradusius plyšius vanduo pateks į gilesnius mūro sluoksnius, skatins tinko sluoksnio dėvėjimąsi."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, aukštalipiai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Fasado remontas		
3	Pažeistų plytų keitimas naujomis	vnt.	130

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Saulius Reva



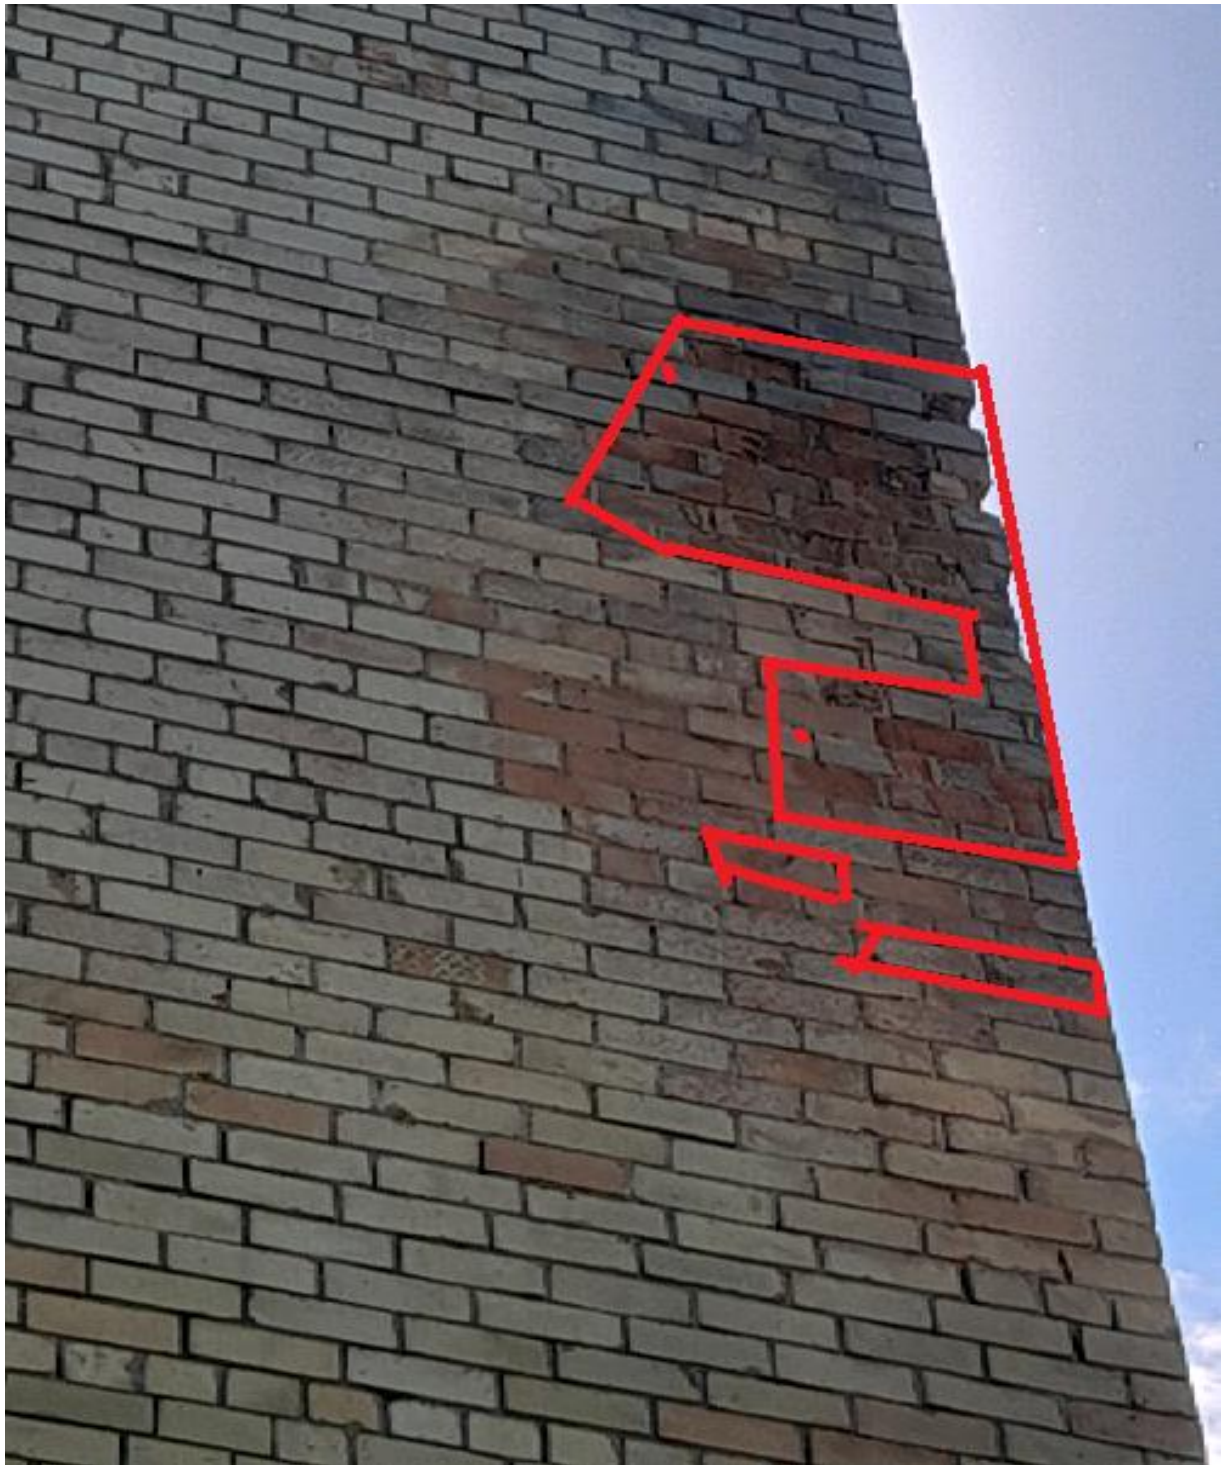

Mūras trupa ir iš balkono vidaus

